

臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
11月月會暨第158次專業技術協調會
會議紀錄

壹、會議時間：112年11月28日(星期二) 下午16時00分

貳、會議地點：三醫工務所 二樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至112年11月26日止，使用工期：324日曆天(不含免計工期4天)，剩餘1528日曆天(展延工期2天)。
- 工程進度截至112年11月26日，預定進度3.1214%，實際進度4.0220%，超前進度：0.9006%(約超前102天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趲趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。

- 施工現況報告：
 1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。
 2. 測量工程：施工構台高程測量。
 3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。
 4. 大地工程：施工構台水平繫梁施作及銲接補強巡檢、土方工程配合整地及降挖出土至GL-22.3M。
第二段擋土柱全數完成。
第三層地錨全數完成支及第四層地錨完成137支。
施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈹施作；構台樁完成86支、中間樁完成34支。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。
2. 目前進度：已於112/11/16召開第四次執行小組會議，專管單位正依會議結論著手修

正中。

【討論事項】

1. 變更設計進度管控：依 112/11/23 院部會議紀錄，管控事項如下說明。
 - (1) 第三醫療大樓預計 116 年第一季完工啟用，113 年下半年開始確認病床、設備及智慧裝置採購品項及數量，編列於 115 年預算中。
 - (2) 下次施工進度報告內容請新增公共藝術設置計畫。
 - (3) 樓層 B2：變更設計圖請與藥學部確認，另會後請營養室確認日後送餐機器人種類及動線，再規劃機器人充電區、位置及面積。
 - (4) 空調機房目前位於值班室及病房中間，請調整空調機房位置，減少有低頻噪音干擾。
- 辦況進度如下：
 - A. 第一點各單位遵照辦理。
 - B. 第二點專管單位配合辦理。
 - C. 第三點 B2F 調整機器人充電區之變更設計圖，設計單位於上周三已和藥學部確認無誤；另營養室希望未來採購機器人為頂升式、動線同原規劃，並無變更；機器人充電區位置設計單位已於上周報告說明。
 - D. 第四點值班室調整方案設計單位已於上周報告說明。
2. 外單位督導：

臺中市環境保護局於 11/23 至本案工區行空氣不良預警檢查，僅進行勸導、宣導之責，並無開罰。經提醒，請施工單位注意相關法規並嚴格控管工地品質。
3. 工程進度：


經施工單位說明，第四層地錨預定於 112/11/29 施拉預力完成，本案共六層地錨已完成四層；施工構台進度稍微延宕，已加派人手共同作業，預計於 112/11/30 進行西側出土作業，預計 112/12/07 起開始趕工進。經提醒，考量施工構台為重要設備，請施工單位確實完成自主檢查及申請查驗，確保構台之安全性後始得啟用。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

伍、散會(下午 16 時 40 分)

陸、會議照片

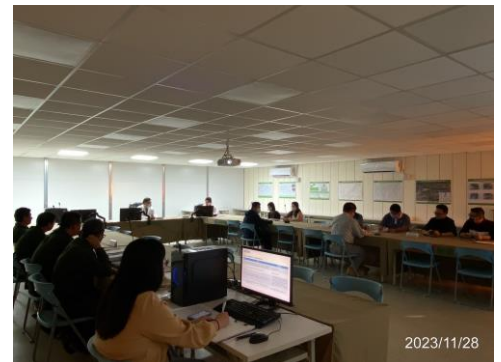

臺中榮民總醫院
 第三醫療大樓新建工程
 112年11月份工程月會報暨第158次專業技術協調會
 會議簽到表

- 壹、 會議時間：112年11月28日(星期二) 下午16時00分
- 貳、 會議地點：三醫工務所 二樓會議室
- 參、 主持人：李副院長 政鴻
- 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院	
副院長	李政鴻
主任秘書	姚銘
醫企部	
工務室	陳蕙芬
	鍾凱 陳思聿
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司	
董榭柏 陳煒 蔡健鈞 江意萱	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所	
趙乙政 廖昱奇 楊雅雁	
施工廠商-麗明營造股份有限公司	
黃以欣 溫榮村 楊雅章 林志銘	

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

11 月工程月會暨第【158】次專業技術協調會議題

時 間	民國 112 年 11 月 28 日 16:00	聯 絡 人	蕭棋柏、江意萱
地 點	麗明工務所 二樓會議室	電 話	04-23592525 #2390
與 會 單 位	臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問股份有限公司 譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務所、麗明營造股份有限公司	行 動 電 話	0912-381-248
		E-mail	Lai.arch162475@gmail.com

會議紀錄內容

- 截至 112 年 11 月 26 日止，使用工期：324 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1528 日曆天(展延工期 2 天)。
- 工程進度截至 112 年 11 月 26 日止，預定進度 3.1214%，實際進度 4.0220%，超前進度：0.9006%(約超前 80 天)。

會議追蹤事項議程：

一. 進度品質管控

期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
大地工程	113/08/19			承商趕趕中

- 依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。

施工現況報告：

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。

測量工程：施工構台高程測量。

水保工程：臨時排水系統清潔整理。

大地工程：施工構台水平繫梁施作及銲接補強巡檢、土方工程配合整地及降挖出土至 GL-22.3M。

第二段擋土柱全數完成。

第三層地錨全數完成及第四層地錨完成 137 支。

施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈹施作；構台樁完成 86 支/86 支、中間樁完成 34 支/34 支。

二. 職安衛安全管理

- 為降低揚塵，請適時灑水。
- 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。
- 施工構台預計於 11 月底施工完成，請承商先行完成自主檢查及申請檢驗停留點查驗，確認符合送審計畫安全無虞，始得開放使用。
- 施工時請考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，做好敦親睦鄰工作。
- 鑒於本工區時有大型施工車輛出入工地，且周邊鄰近醫院及住宅區，行人進出堪稱頻繁，於工區出入口及四周明顯的位置，設置必要之安全警示燈及警示標示；車輛進出時，應有著反光背心及指揮棒之交管人員負責指揮引導，避免大型車輛視線死角造成危害。

三. 文書資料管控

公共藝術設置計畫：

- 目前進度如以下說明：已於 112/11/16 召開第四次執行小組會議，專管單位正依會議結論著手修正中。

1/400 比例尺之模型：

- 依第 137 次專技會議紀錄，應於 112/09/15 前提送模型。
- 設計單位已於 112/09/15 發文提送，廠商並於 112/09/18 進場擺設。

監造單位審查中計畫書：

設計監造單位報告：

- 設計監造單位就管制項目及現場作為報告

施工單位報告：

- 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告

業主交辦事項：

- 無
