

臺中榮民總醫院 新門診大樓興建工程 專案計畫執行進度

資料截止日期：105 年 11 月 31 日

1. 建築規模：地下三層、地上八層 RC 構造

2. 工程總價：9 億 6,685 萬元

3. 施工期程：103 年 02 月 09 日至 105 年 11 月 18 日。

4. 工程進度：預定:100%、實際:100%。

5. 施工項目：

(1). 建築結構工程：已施作完竣，目前進行驗收作業。

(2). 外牆裝修工程：已施作完竣，目前施作外牆清洗。


(3). 室內裝修工程：已施作完竣，目前施作清理、附屬工程醫療設備安裝，及各醫療使用單位籌辦後續搬遷事宜。

(4). 水電空調工程：已施作完竣及檢測完成，辦理設備移交操作教育訓練。

6. 施工照片：

拍照日期	105/11/18	
工程項目	景觀工程	
拍照說明	屋頂景觀花園完成	
備註		
拍照日期	105/11/18	
工程項目	外牆裝修工程	
拍照說明	外牆及雨遮施作完成	
備註		


拍照日期	105/11/18
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	候診區及診間完成
備註	

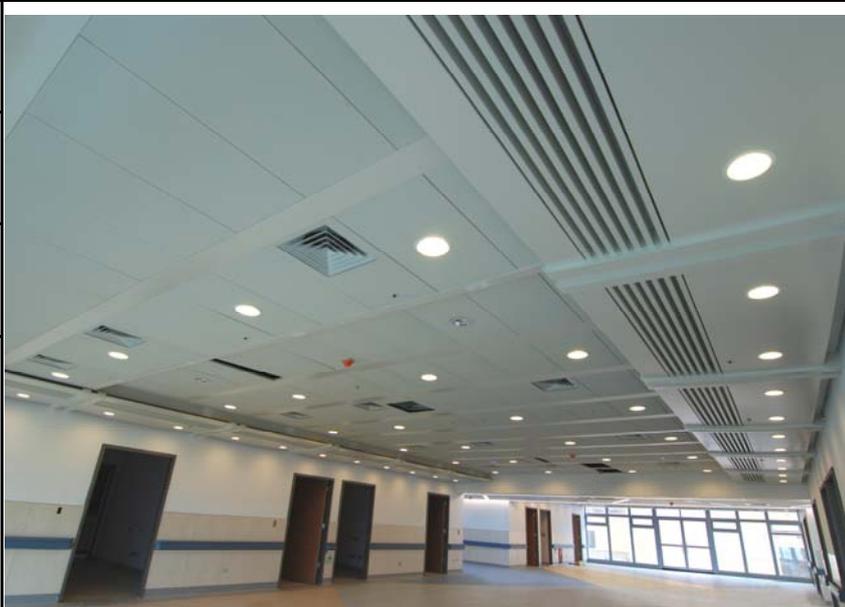


拍照日期	105/11/18
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	各層中央走道完成
備註	



拍照日期	105/11/18
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	各層主要入口大廳完成
備註	

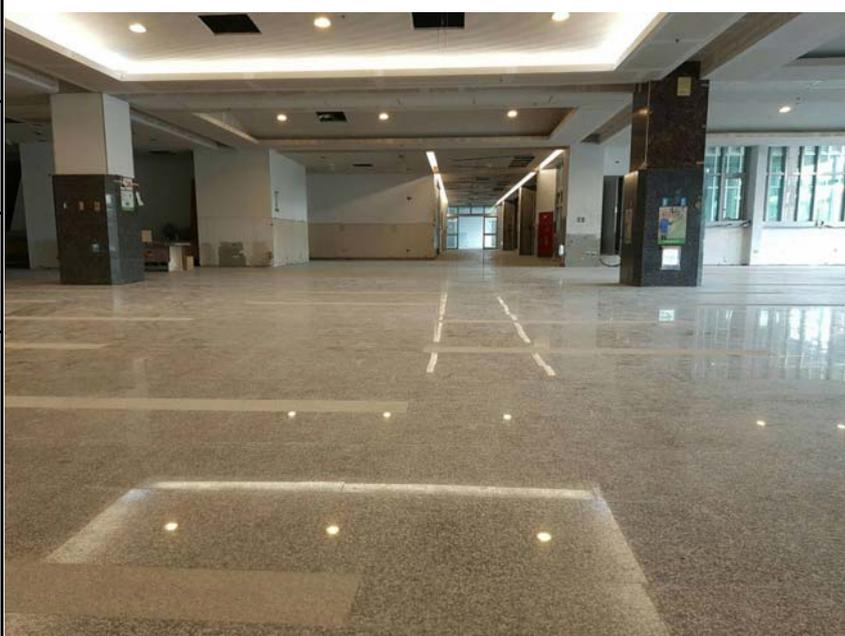

拍照日期	105/11/18
工程項目	景觀工程
拍照說明	基地周遭戶外景觀完成
備註	

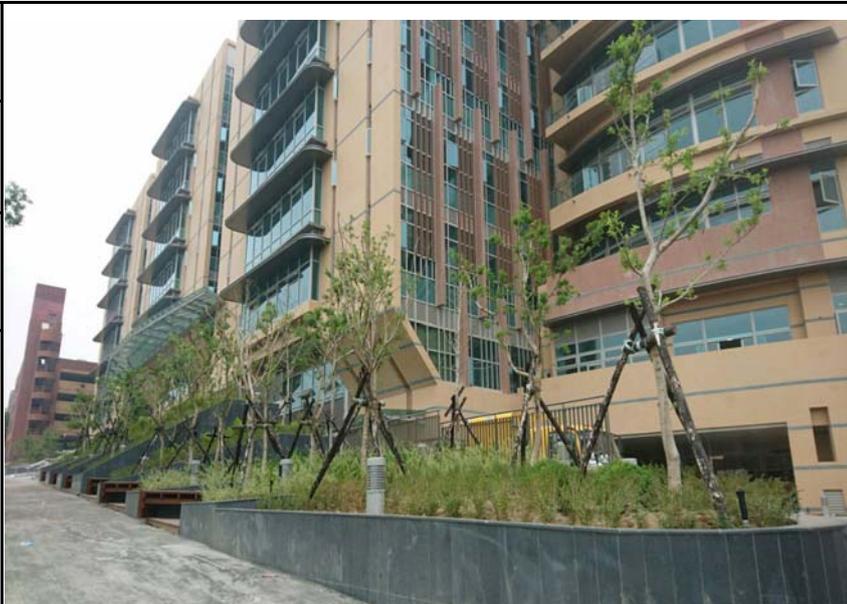

拍照日期	105/11/18
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	建築物名稱外牆題字完成
備註	



拍照日期	105/11/18
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	建築物夜間燈光測試完成
備註	



拍照日期	105/11/18	
工程項目	景觀工程	
拍照說明	車道及地下室停車設施完成	
備註		
