

臺中榮民總醫院 新門診大樓興建工程 專案計畫執行進度

資料截止日期：105 年 7 月 31 日

1. 建築規模：地下三層、地上八層 RC 構造

2. 工程總價：9 億 6,685 萬元

3. 施工期程：103 年 02 月 09 日至 105 年 11 月 16 日。

4. 工程進度：預定:94.11%、實際:94.12%、+0.01%。

5. 施工項目：

(1). 建築結構工程：主體結構已施作完成，目前施作基地周圍排水溝、道路及景觀工程。

(2). 外牆裝修工程：施作外牆貼磚及防水施作、帷幕牆及遮陽板安裝。

(3). 室內裝修工程：

1. 施作天花板工程。

2. 施作地坪工程。

(4). 水電空調工程：

1. 施作廁所排氣風管安裝。

2. 施作給水配管、發電機油箱、排煙管安裝。

3. 施作電氣弱電消防、匯流排設備安裝。

4. 施作衛浴設備安裝。

5. 施作天花板機電消防空調設備安裝。

6. 施工照片：

拍照日期	105/7/8	
工程項目	發電機設備工程	
拍照說明	發電機油管安裝檢查	
備註		

拍照日期	105/7/8
工程項目	發電機設備工程
拍照說明	發電機排煙淨化器、消音箱、散熱氣罩安裝
備註	




拍照日期	105/6/26
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	外牆拆架
備註	



拍照日期	105/6/25
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	外牆拆架
備註	



拍照日期	105/6/24
工程項目	室內裝修工程
拍照說明	梯廳石材地坪施作
備註	
拍照日期	105/7/2
工程項目	空調設備工程
拍照說明	5F 空調水管配裝
備註	
拍照日期	105/7/1
工程項目	電氣設備工程
拍照說明	4F 分電盤結線
備註	

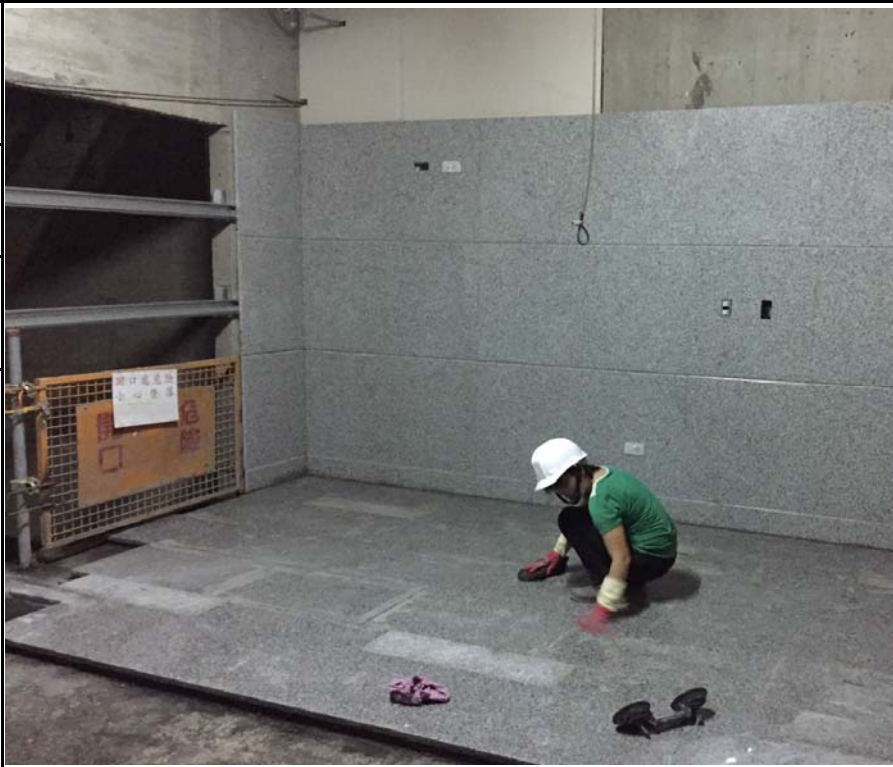

拍照日期	105/6/28
工程項目	電氣設備工程
拍照說明	RF 立面線型條燈電源線連接
備註	



拍照日期	105/6/26
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	外牆拆架
備註	



拍照日期	105/6/24
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	4F 玻璃安裝
備註	



拍照日期	105/6/23
工程項目	外牆裝修工程
拍照說明	RF 屋頂防水施作
備註	
拍照日期	105/6/22
工程項目	三級品管機制
拍照說明	第 6 次退輔會工程查核
備註	

